

Rapport n° : RNE 20-5048-1 établi le : 14/08/2020

page : 1 / 3

Affaire : **TOYOTA, ONNAING (59)**Demandeur : Mr Bastien JONVILLE, Agence HAINAUT Ets Denain,  
Rue des Coopérateurs BP 108, 59722 DENAIN.

n° affaire : ANE 20-537

Couche : **couche de forme**Matériau : **GNT**Fournisseur : **TERRASSEMENTS, DIVERS CHANTIERS (00)**


Date des mesures : 13/08/2020

Méthode : NF P 94-117-2/Dérog. n°3

Plage de mesure de portance EV2 : 20 à 250 MPa

Situation des points de mesure					module dynamique Edyn2 MPa
n°					
1					150
2					137
3					159
4					122
5					121
6					97
7					111
8					147
9					148
10					129
11					120
12					131
13					105
14					207
15					147
16					113
17					164
18					143
19					131
20					133
21					132
22					125
23					111
24					175
25					104
26					155
27					82

Module dynamique (Mpa)

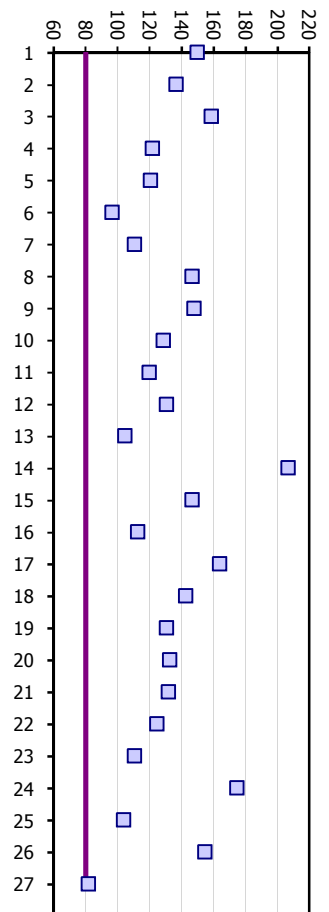

## Mesures de module de portance dynamique

Moyenne : **133 MPa**  
 écart type : 26 MPa  
 valeur minimale : **82 MPa**  
 valeur maximale : **207 MPa**  
 nombre de mesures : 27

 Spécification  
de module de portance dynamique

 mini  
**80 MPa**

Domaine

Mesures


Edyn2 ≥ 80 MPa

nombre

en %

27

100.0

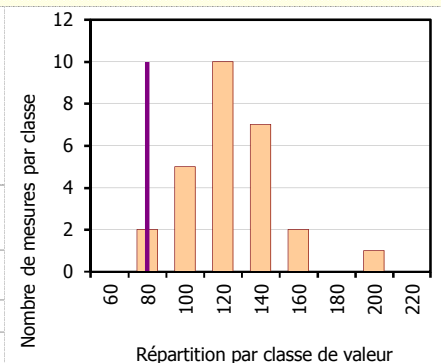Recevabilité du lot : **lot conforme**

**RAPPORT DE MESURES  
DE PORTANCE A LA DYNAPLAQUE**

Rapport n° : RNE 20-5048-1 établi le : 14/08/2020

page : 2 / 3

Affaire : **TOYOTA, ONNAING (59)**Demandeur : Mr Bastien JONVILLE, Agence HAINAUT Ets Denain,  
Rue des Coopérateurs BP 108, 59722 DENAIN.

n° affaire : ANE 20-537

Couche : couche de forme

Matériau : **GNT**

Fournisseur : TERRASSEMENTS, DIVERS CHANTIERS (00)

Date des mesures : 13/08/2020

**Informations complémentaires**

Appareil : Dynaplaque II N° 803H0006-0005

Observations :  
Essais et rapport réalisé par Thomas Blancart.Le Chef de Laboratoire :  
**Denis BIZART**

Rapport n° : RNE 20-5048-1 établi le : 14/08/2020

page : 3 / 3

Affaire : **TOYOTA, ONNAING (59)**Demandeur : Mr Bastien JONVILLE, Agence HAINAUT Ets Denain,  
Rue des Coopérateurs BP 108, 59722 DENAIN.

n° affaire : ANE 20-537

Couche : couche de forme

Matériau : GNT

Fournisseur : TERRASSEMENTS, DIVERS CHANTIERIS (00)

Date des mesures : 13/08/2020

Schéma d'implantation des mesures :

<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>
<b>24</b>	<b>23</b>	<b>22</b>
<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>
<b>18</b>	<b>17</b>	<b>16</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>12</b>	<b>11</b>	<b>10</b>
<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>

# Base vie
